

		Relatório n°	2		
		Data do relatório	11/01/2025 - 11/02/2025		
		Dia da semana	Sábado até Terça-Feira		
RVV- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E DIÁRIO DE OBRA		Contrato	61/2024		
Obra	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL		Prazo contratual	183 dias	
Local	AL 101, AL Norte, SN, CEP 57955-000, Maragogi-AL		Prazo decorrido	64 dias	
Contratante	PREFEITURA DE MARAGOGI/AL	Responsável	MATHEUS ARRUDA COSTA	Prazo a vencer	119 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀️ Claro	Praticável
Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (14)						
Ajudante 2	Engenheiro 1	Mestre de Obra 1	Pedreiro 2	Servente 8		Mão de Obra Própria (14)

Atividades (1)

<p>11/01/2025 - SEM ATIVIDADES (SÁBADO)</p> <p>12/01/2025 - SEM ATIVIDADES (DOMINGO)</p> <p>13/01/2025 - ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA; CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS; TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO; CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR;</p> <p>14/01/2025 - ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA; CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS; TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO; CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR;</p> <p>15/01/2025 - ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA; CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS; TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO; CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR;</p> <p>16/01/2025 - ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA; CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS; TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO; CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR; REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO;</p> <p>17/01/2025 - ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA; CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS; TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO; CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR; REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO;</p> <p>18/01/2025 - SEM ATIVIDADES (SÁBADO)</p> <p>19/01/2025 - SEM ATIVIDADES (DOMINGO)</p> <p>20/01/2025 - ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA; REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO; CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS; CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR;</p> <p>21/01/2025 - ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA; REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO; CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS; CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR;</p> <p>22/01/2025 - ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA; REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO;</p> <p>23/01/2025 - ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO;</p> <p>24/01/2025 - ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO;</p> <p>25/01/2025 - SEM ATIVIDADES (SÁBADO)</p> <p>26/01/2025 - SEM ATIVIDADES (DOMINGO)</p> <p>27/01/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>28/01/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>29/01/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>30/01/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>31/01/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>01/02/2025 - SEM ATIVIDADES (SÁBADO)</p> <p>02/02/2025 - SEM ATIVIDADES (DOMINGO)</p> <p>03/02/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>04/02/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>05/02/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>06/02/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>07/02/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>08/02/2025 - SEM ATIVIDADES (SÁBADO)</p> <p>09/02/2025 - SEM ATIVIDADES (DOMINGO)</p> <p>10/02/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p> <p>11/02/2025 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO; EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;</p>	<p>Em Andamento</p>
--	---------------------

Fotos (30)



- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS;



- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS;



- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS;



- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS;



- ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA;



- ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA;



- ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA;



- ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA;



- ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA;



- RECEBIMENTO DE MATERIAL (MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO);



- RECEBIMENTO DE MATERIAL (MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO);



- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO;



- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO;



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO);



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO);



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO);



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO);



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;




- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA; - CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR;



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA; - CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR;

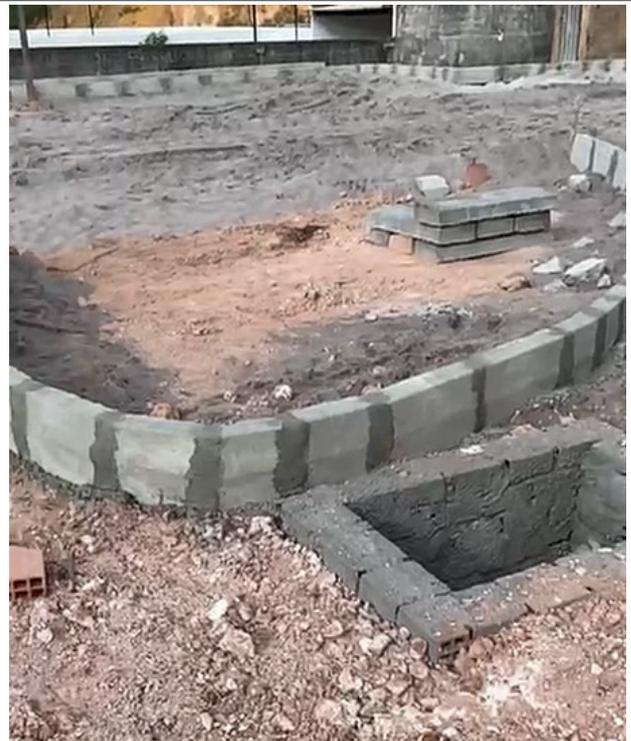

- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA; - CAIXA PARA BOCA DE LOBO RETANGULAR;



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;




- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;

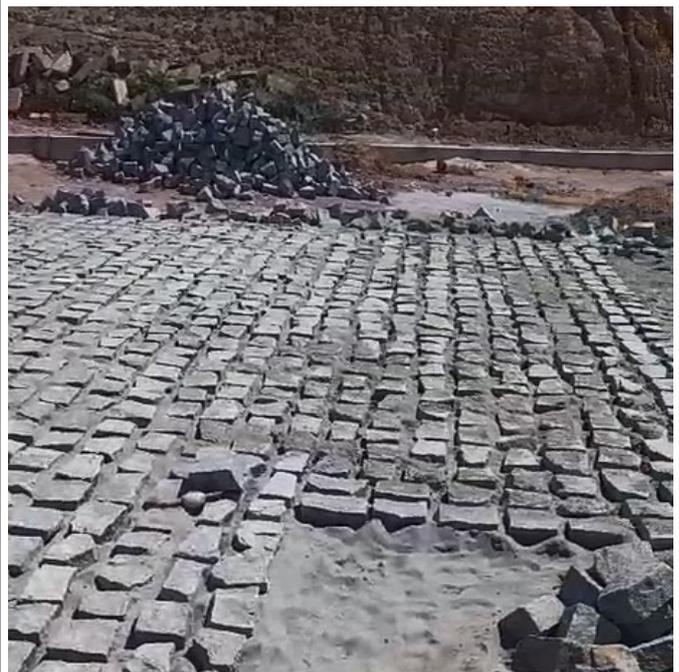

- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;



- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO); - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA;
